2011
2012

STATI D'AVANZO

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO "E" ALLA BOZZA DI CONVENZIONE PAG. 1

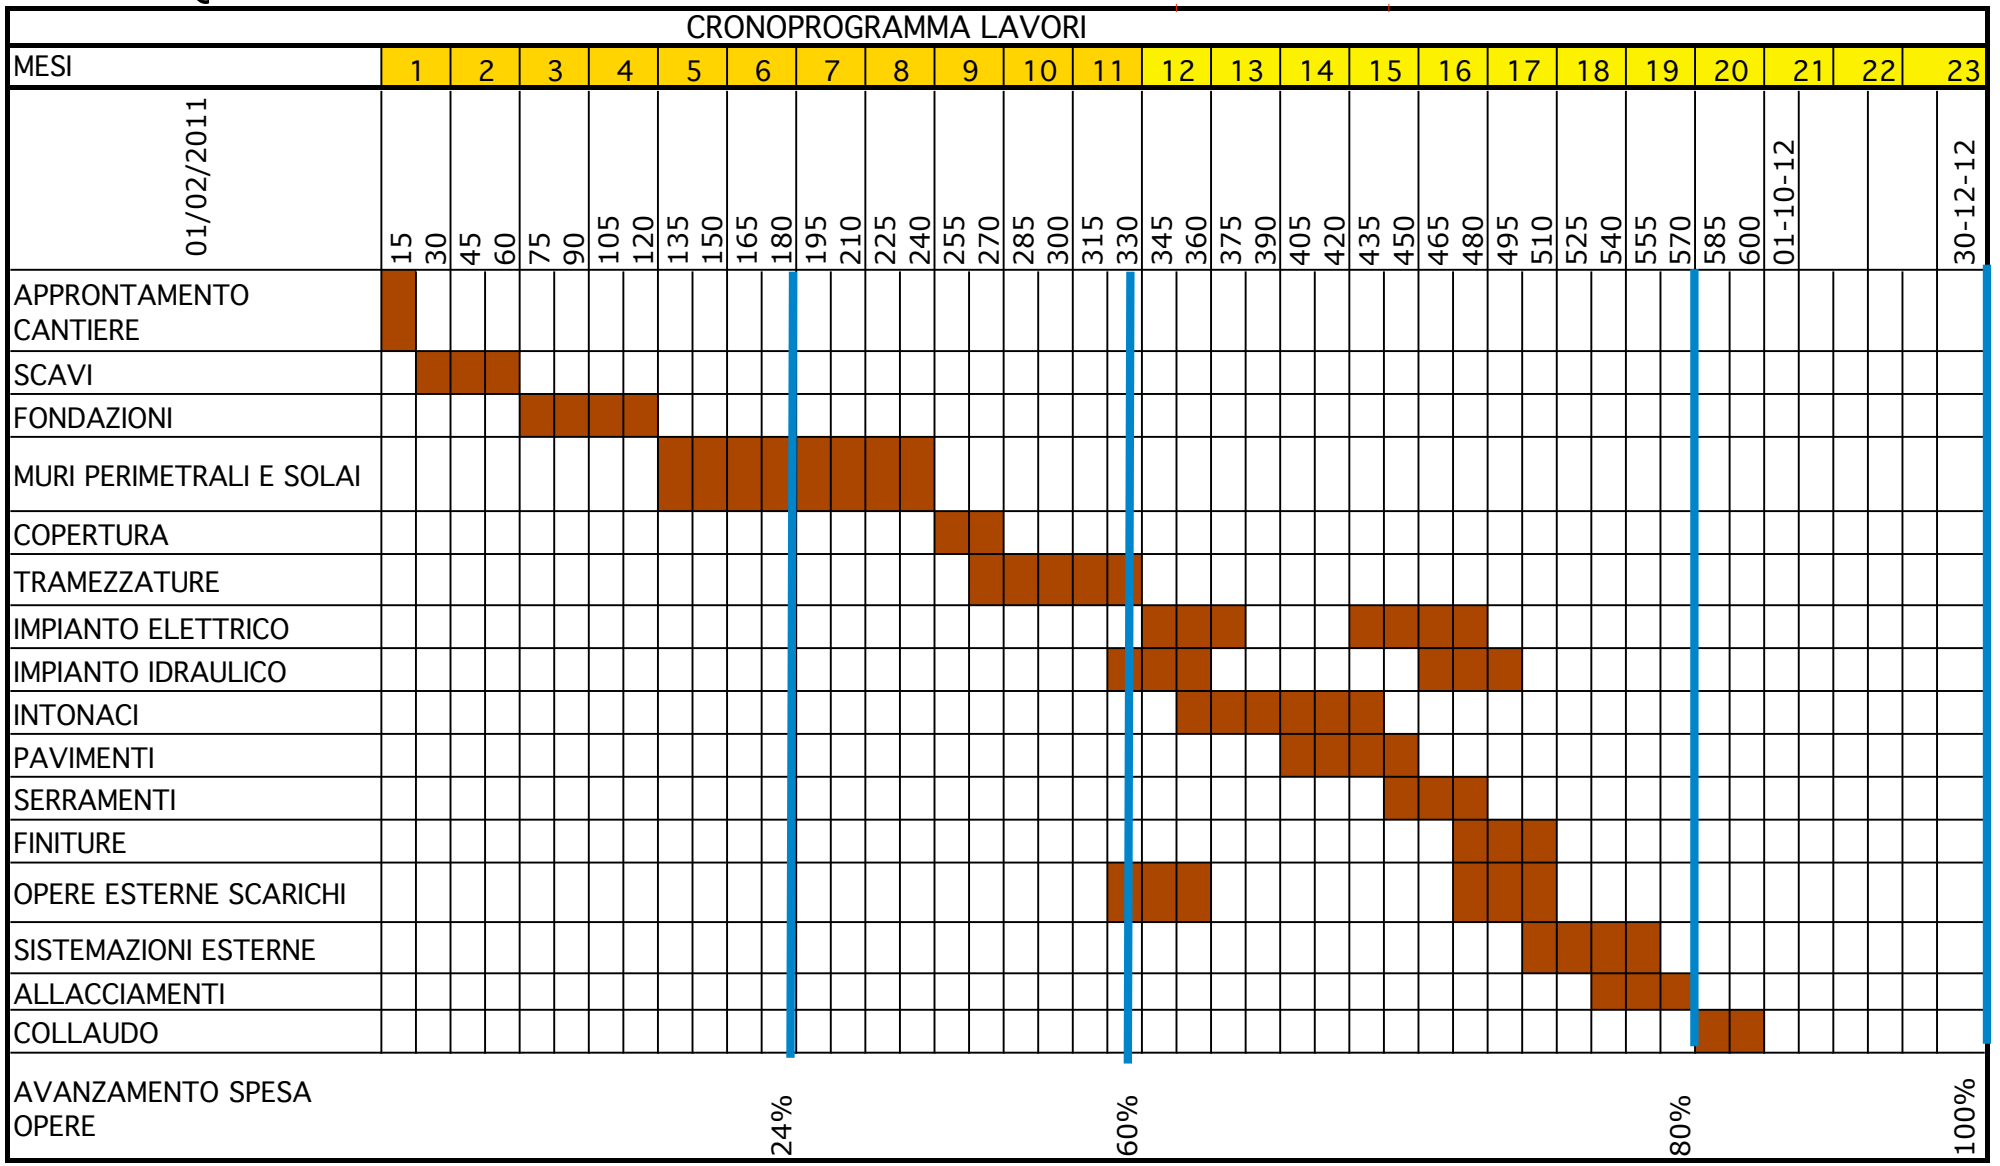

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO "E" ALLA BOZZA DI CONVENZIONE PAG. 2

ACCONTI CORRISPOSTI ALSOGGETTO ATTUATORE				
DESCRIZIONE	PERCENTUALE STIMATA	IMPORTO PRESTAZIONE STIMATO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPOSTO
1 PRIMO SOLAIO	24%	€ 475.981,84	€ 430.000,00	€ 515.000,00
2 TRAMEZZATURE	60%	€ 1.189.954,60	€ 650.000,00	€ 1.080.000,00
3 FINE LAVORI	80%	€ 1.586.606,14	€ 350.000,00	€ 1.430.000,00
4 A 90 GG COLLAUDO	100%	€ 1.983.257,67	€ 553.257,67	€ 1.983.257,67
TOTALE			€ 1.983.257,67	

N.B IMPORTI DA INCREMENTARE DELL'IVA PARI AL 20%
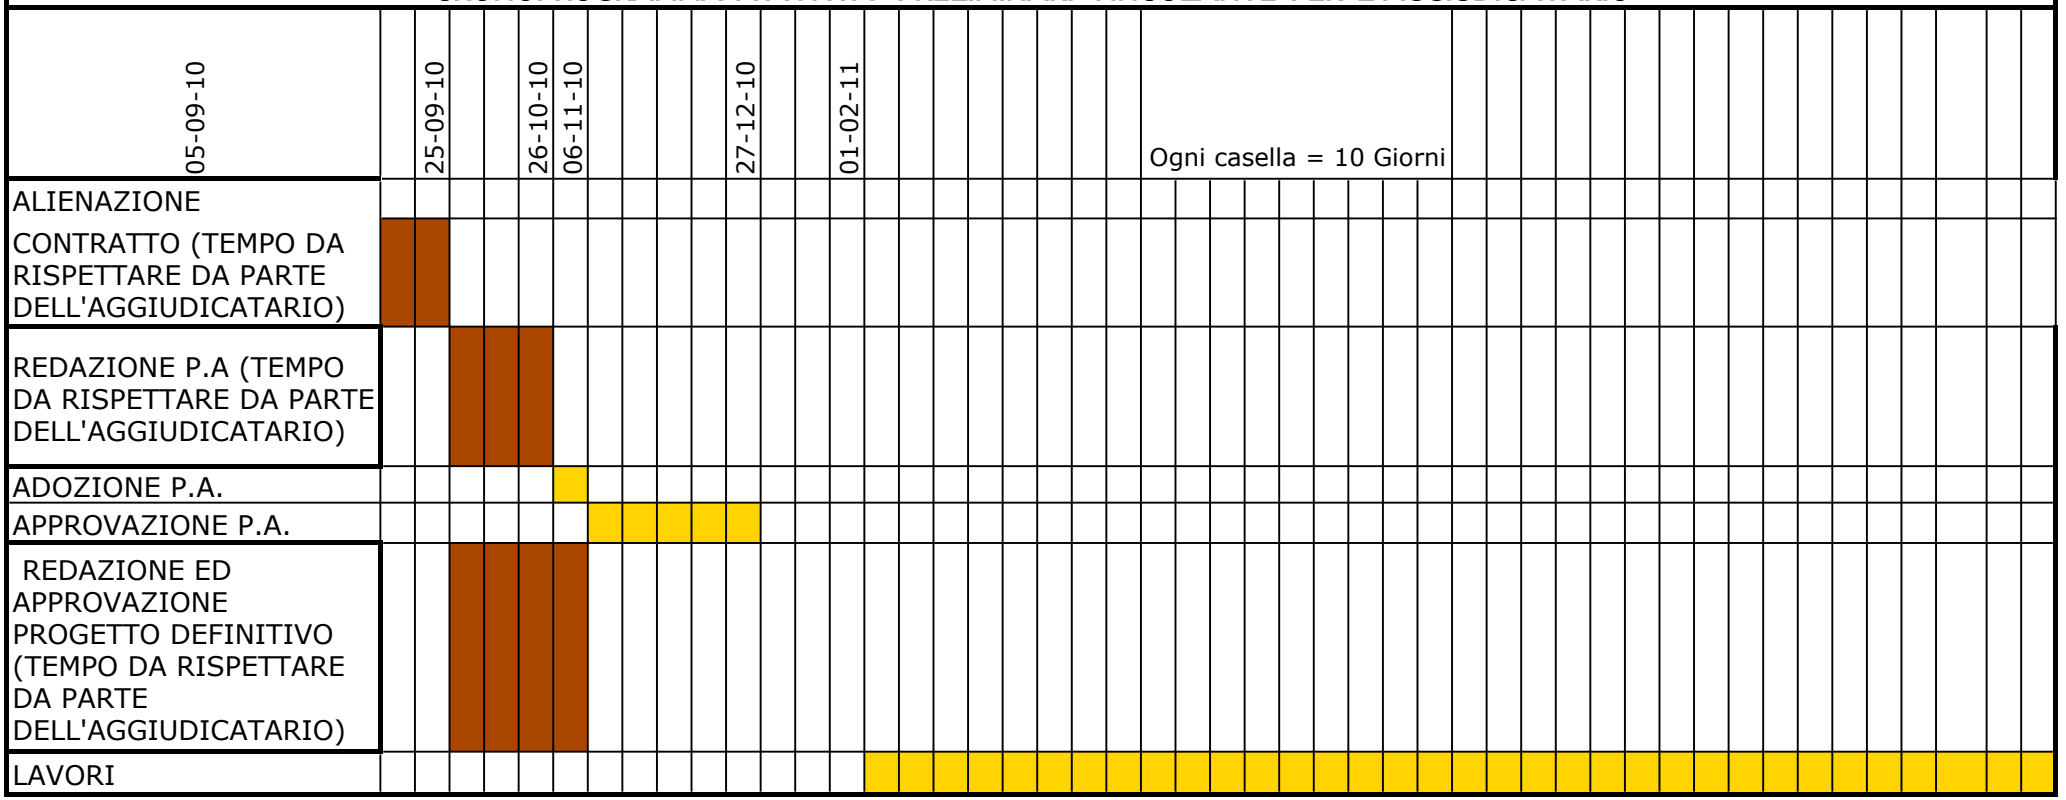
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PRELIMINARI VINCOLANTE PER L'AGGIUDICATARIO
